



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO**

Lumbaquí – Sucumbíos - Ecuador

COMISION DE GESTION INTERINSTITUCIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL



INFORME NO. 14

COMISION DE GESTION INTERINSTITUCIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL/ LEGISLACION Y FISCALIZACION.

Para: Ing. Darwin Azes
ALCALDE

De: Dr. Jorge Tipanluiza,, Sr. Arturo Narváez.
CONCEJALES GADMCGP

Fecha: 01/11/ 2024.

Asunto: INFORME DE INSPECCION A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS CUBIERTAS DE USO MULTIPLE PARA VARIOS SECTORES DEL CANTON GONZALO PIZARRO, PROVINCIA DE SUCUMBIOS. La Amarilla.

1.- ANTECEDENTES:

En mención a las atribuciones de los concejales: COOTAD Art. 58.- Atribuciones de los concejales o concejalas. d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con este Código y la ley.

De acuerdo a LA ORDENANZA DE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO. Art. 17.- Atribuciones de las Concejalas y los Concejales. - f. Emitir informes con respecto a la gestión del ejecutivo para que el Concejo proceda con su fiscalización;

Con fecha 2 febrero 2024 se suscribe el CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS CUBIERTAS DE USO MÚLTIPLE PARA VARIOS SECTORES DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”

No. 001-COTO-2024, CÓDIGO: COTO-GADMCGP-2023-001.

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS CUBIERTAS DE USO MÚLTIPLE PARA VARIOS SECTORES DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS

CONTRATISTA: CONSORCIO GALUME)

MONTO: USD 750.169,50406 (MÁS IVA)

PLAZO: CIENTO OCHENTA DÍAS

ANTICIPO: 50%

ADMINISTRADOR: DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN.

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 08 FEBRERO 2024.

FECHA DE PLAZO CONTRACTUAL: 6 NOVIEMBRE 2024

2.- DESARROLLO:

Mediante oficio No. 006-FGADMCGP- febrero 19 – 2024, remite el Fiscalizador del Contrato, Ing. Flavio Aguinaldo Minga al Administrador del Contrato Ing. Daniel Eras, con los siguientes antecedentes.

- Con fecha 09 de febrero 2024, se suscribe entre las partes el ACTA DE INICIO DE OBRA, en la cual se acuerda el inicio de trabajo 09-02-2024.
- Con oficio No. CCCGP-001-2024 de fecha 15 febrero 2024, Consorcio antes indicado expone y solicita la aprobación de ciertos requerimientos de vital importancia en la obra.



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO**

Lumbaquí – Sucumbíos - Ecuador

COMISION DE GESTION INTERINSTITUCIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL



- Con oficio No. 004-DP-GADMCGP-2024 de fecha 19 febrero 2024, remitido por la administración de contrato, se solicita al Fiscalizador de la Obras Publicas, emita Informe Técnico sobre lo manifestado en el oficio No. CCCGP-001-2024 de fecha 15 febrero 2024.

Dentro de las conclusiones del oficio en mención, están:

-se ha verificado que al momento de valorar al mismo se han omitido ciertos rubros, los cuales son necesarios ejecutar para cumplir con las condiciones técnicas y funcionales que demanda dicho proyecto y por ende el objeto del contrato.

Mediante informe Nro. 0016-GADMGPDE-2024 de fecha 20 febrero 2024. Suscrito por el Administrador de la obra, en el que concluye:

-Gestionar con el Departamento competente el financiamiento para la ejecución de los rubros faltantes.

Con fecha 13 de mayo 2004 se suscribe el **CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 01, AL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS CUBIERTAS DE USO MÚLTIPLE PARA VARIOS SECTORES DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS” PROCESO: COTO-GADMCGP-2023-001.C**, por el monto de 52.906,57, que equivale al 7.05% del monto contractual.

Fiscalizador: Ing. Edi Recuenco

Administrador del contrato: Director de Obras Públicas.

Con fecha lunes 30 de octubre 2024, se realiza la inspección de la obra **CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS CUBIERTAS DE USO MULTIPLE PARA VARIOS SECTORES DEL CANTON GONZALO PIZARRO, PROVINCIA DE SUCUMBIOS**. Con los señores concejales Sr. Arturo Narváez, Dr. Jorge Tipanliza en el Sector La Amarilla, Kasha Yacu, Waira Urco, Linda, Rio Tigre, La Unión, San Pablo.

COMUNIDAD LA AMARILLA (Ubicado en el sector la amarilla)

Foto No. 1 Prolongación de Columnas y colocación de placas sobre las columnas anteriormente existentes antes del contrato.



30 oct 2024 9:05:18 a. m.
0.08931164N 77.37830554W
304° NW
Altitud:503.4m
Velocidad:4.1km/h
Número de índice: 32



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO**

Lumbaquí – Sucumbíos - Ecuador


COMISION DE GESTION INTERINSTITUCIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL



Foto No. 2 La cancha aún no se instala el entechado Galvalumen prepintado.



Obra paralizada, sin presencia de trabajadores.





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO

Lumbaquí – Sucumbíos - Ecuador

COMISION DE GESTION INTERINSTITUCIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL

7. CUBIERTA RECINTO LA AMARILLA											
CUBIERTA											
MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	KG	10,712.00	0,15	1606.80	10,711.81	0	10,711.81	1606.77	0	1606.77	100.00%
ENTECHADO GALVALUMEN PREPINTADO E=0.4MM	M2	872	17,2	14,998.40	872	0	872	14,998.40	0	14,998.40	100.00%
CANCHA											
SUMINISTRO E INST. DE CANAL RECOLECTOR DE AA LL EN ACERO INOXIDA	M	64	15,03	961.92	64	0	64	961.92	0	961.92	100.00%
SUMINISTRO E INST. BAJANTES DE AA LL PVC =110MM	M	36	12,91	464.76	36	0	36	464.76	0	464.76	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC Ø =110 MM DESAGÜE	M	10	10,14	101.4	10	0	10	101.4	0	101.4	100.00%
SISTEMA ELECTRICO											
RED MEDIO VOLTAJE											
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE CON TUBERIA EMT DE 3"	U	1	406,95	406,95	1	0	1	406,95	0	406,95	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO DE REVISION TIPO A 60x60x60 CM +TAPA DE POZO	U	2	107,35	214,7	2	0	2	214,7	0	214,7	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE TTU # 2 AWG CO0-0P 2x2+2	M	15,74	33,6	528,86	15,71	0	15,71	527,86	0	527,86	99.81%
TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL					0						
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT PARA ENTRADA Y SALIDA	U	1	71,75	71,75	1	0	1	71,75	0	71,75	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE TTU # 6 AWG CO0-0P 2x6+6	M	14,32	8,55	122,44	14,28	0	14,28	122,09	0	122,09	99.71%
SUMINISTRO E INSTALACION DEL GABINETE HERMETICO DE 30 X 50 PARA 8 PUNTOS (INCLUYE ACCISORIOS)	U	1	738,72	738,72	1	0	1	738,72	0	738,72	100.00%
SISTEMA DE ILUMINACION											
SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES 150W	U	4	173,67	694,68	4	0	4	694,68	0	694,68	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES 200W	U	13	205,74	2,674.62	13	0	13	2,674.62	0	2,674.62	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR CONCENTRICO # 3X12 AWG	M	257,16	9,2	2,365.87	257,14	0	257,14	2,365.69	0	2,365.69	99.99%
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE PUNTOS DE ILUMINACION	U	17	8,64	146,88	17	0	17	146,88	0	146,88	100.00%
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA											
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA CON DOS VARILLA	U	1	161,43	161,43	0	0	0	0	0	0	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA CON UNA VARILLA	U	1	65,52	65,52	0	0	0	0	0	0	0.00%

Fuente: Quipux GADMC-Gonzalo Pizarro, periodo de planilla 01-sep hasta 30 septiembre 2024



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO**

Lumbaquí – Sucumbíos - Ecuador

COMISION DE GESTION INTERINSTITUCIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL



COMUNIDAD WAIRA URCO

Foto No. 3 Contrapiso sin construcción.



Foto No. 4 Contrapiso sin construcción.



Obra paralizada sin presencia de trabajadores



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO**

Lumbaquí – Sucumbíos - Ecuador

COMISION DE GESTION INTERINSTITUCIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES Y PRECIO CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS			PORCENTAJE
			CANTID.	P. UNIT.	P. TOTAL	ANT.	ESTA PLAN.	TOTAL FECHA	ANT.	ESTA PLAN.	TOTAL FECHA	
	PRELIMINARES											
	1. COMUNIDAD DE WAYRA URKU											
	CUBIERTA											
12	PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURA METÁLICA	KG	10,712.00	0,22	2,356.64	10,71181	0	10,71181	2,356.60	0	2,356.60	100.00%
13	MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	KG	10,712.00	0,15	1,606.80	10,71181	0	10,71181	1,606.77	0	1,606.77	100.00%
14	ENTECHADO GALVALUMEN PREPINTADO E=0.4MM	M2	872	17,2	14,998.40	872	0	872	14,998.40	0	14,998.40	100.00%
	CANCHA											
20	BORDILLO DE H.S.(F'C=210 KG/CM2 - 0,15X0,40)	M	100	17,83	1,783.00	100	0	100	1,783.00	0	1,783.00	100.00%
21	CONTRAPISO DE H.S F'C=210 KG/CM2 E=10CM, ALISADO	M2	600	21,04	12,624.00	600	0	600	12,624.00	0	12,624.00	100.00%
22	MALLA ELECTROSOLDADA R-196	M2	600	5,03	3,018.00	600	0	600	3,018.00	0	3,018.00	100.00%
23	JUNTA DE DILACION	M	160	3,9	624	160	0	160	624	0	624	100.00%
24	SEÑALIZACION DE CANCHA	U	1	559,76	559,76	0	1	1	0	559,76	559,76	100.00%
25	PINTURA ACRILICA PARA CANCHA(DOS MANOS)	M2	600	4,62	2,772.00	0	600	600	0	2,772.00	2,772.00	100.00%
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCOS METALICOS	U	2	612,42	1,224.84	0	2	2	0	1,224.84	1,224.84	100.00%
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE AROS DE BALONCESTO EN V	U	2	1,453.35	2,906.70	0	2	2	0	2,906.70	2,906.70	100.00%
28	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA DE VOLEY, INCLU	U	1	169,59	169,59	0	1	1	0	169,59	169,59	100.00%

Fuente: Quipux GADMC-Gonzalo Pizarro, periodo de planilla 01-sep hasta 30 septiembre 2024



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO**

Lumbaquí – Sucumbíos - Ecuador

COMISION DE GESTION INTERINSTITUCIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL

	SISTEMA ELECTRICO											
	RED BAJO VOLTAJE											
	BAJANTE Y ACOMETIDA DESDE TRANSFORMADOR AL MEDIDOR											
44	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE CON TUBERIA EMT DE 3"	U	1	406,95	406,95	1	0	1	406,95	0	406,95	100.00%
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO DE REVISION TIPO A 60x60x60 CM +TAPA DE POZO	U	2	107,35	214,7	2	0	2	214,7	0	214,7	100.00%
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE TTU# 2 AWG CO0-0P 2x2+2	M	15,71	33,6	527,86	15,71	0	15,71	527,86	0	527,86	100.00%
	TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL											
47	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT PARA ENTRADA Y SALIDA	U	1	71,75	71,75	1	0	1	71,75	0	71,75	100.00%
48	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE TTU# 6 AWG CO0-0P 2x6+6	M	14,28	8,55	122,09	14,28	0	14,28	122,09	0	122,09	100.00%
49	SUMINISTRO E INSTALACION DEL GABINETE HERMETICO DE 30 X 50 PARA 8 PUNTOS (INCLUYE ACCESORIOS)	U	1	738,72	738,72	1	0	1	738,72	0	738,72	100.00%
	SISTEMA DE ILUMINACION											
50	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES 150W	U	4	173,67	694,68	4	0	4	694,68	0	694,68	100.00%
51	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES 200W	U	13	205,74	2,674.62	13	0	13	2,674.62	0	2,674.62	100.00%
52	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR CONCENTRICO # 3X12 AWG	M	257,14	9,2	2,365.69	257,14	0	257,14	2,365.69	0	2,365.69	100.00%
53	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE PUNTOS DE ILUMINACION	U	17	8,64	146,88	17	0	17	146,88	0	146,88	100.00%
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA											
54	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA CON DOS VARILLAS	U	1	161,43	161,43	0	1	1	0	161,43	161,43	100.00%
55	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA CON UNA VARILLA	U	1	65,52	65,52	0	1	1	0	65,52	65,52	100.00%

Fuente: Quipux GADMC-Gonzalo Pizarro, periodo de planilla 01-sep hasta 30 septiembre 2024



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO**

Lumbaquí – Sucumbíos - Ecuador

COMISION DE GESTION INTERINSTITUCIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL



COORPORACION PLAYAS DEL RIO TIGRE

Foto No. 5 Contrapiso sin construcción.



Foto No. 6 Entechado Galvalumen Prepintado sin instalar





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO

Lumbaquí – Sucumbíos - Ecuador

COMISION DE GESTION INTERINSTITUCIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL

2. CORPORACION PLAYAS DEL RIO TIGRE											
CUBIERTA											
ENTECHADO GALVALUMEN PREPINTADO E=0.4MM	M2	872	17,2	14,998.40	872	0	872	14,998.40	0	14,998.40	100.00%
CANCHA											
CONTRAPISO DE H.S F'C=210 KG/CM2 E=10CM, ALISADO	M2	600	21,04	12,624.00	600	0	600	12,624.00	0	12,624.00	100.00%
MALLA ELECTROSOLDADA R-196	M2	600	5,03	3,018.00	600	0	600	3,018.00	0	3,018.00	100.00%
JUNTA DE DILATACION	M	160	3,9	624	160	0	160	624	0	624	100.00%
SEÑALIZACION DE CANCHA	U	1	559,76	559,76	0	1	1	0	559,76	559,76	100.00%
PINTURA ACRILICA PARA CANCHA(DOS MANOS)	M2	600	4,62	2,772.00	0	600	600	0	2,772.00	2,772.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS METALICOS	U	2	612,42	1,224.84	0	2	2	0	1,224.84	1,224.84	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE AROS DE BALONCESTO EN VIDRIO TEMP L	U	2	1,453.35	2,906.70	0	2	2	0	2,906.70	2,906.70	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION MALLA DE VOLEY, INCLUYE SOPORTE	U	1	169,59	169,59	0	1	1	0	169,59	169,59	100.00%
SISTEMA ELECTRICO											
RED MEDIO VOLTAJE											
RED BAJO VOLTAJE											
BAJANTE Y ACOMETIDA DESDE TRANSFORMADOR AL MEDIDOR											
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE CON TUBERIA EMT DE 3"	U	1	406,95	406,95	1	0	1	406,95	0	406,95	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO DE REVISION TIPO A 60x60x60 CM +TAPA DE POZO	U	2	107,35	214,7	2	0	2	214,7	0	214,7	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE TTU # 2 AWG CO0-0P 2x2+2	M	15,71	33,6	527,86	15,71	0	15,71	527,86	0	527,86	100.00%
TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL											
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT PARA ENTRADA Y SALIDA	U	1	71,75	71,75	1	0	1	71,75	0	71,75	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE TTU # 6 AWG CO0-0P 2x6+6	M	14,28	8,55	122,09	14,28	0	14,28	122,09	0	122,09	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DEL GABINETE HERMETICO DE 30 X 50 PARA 8 PUNTOS (INCLUYE ACCESORIOS)	U	1	738,72	738,72	1	0	1	738,72	0	738,72	100.00%
SISTEMA DE ILUMINACION											
SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES 150W	U	4	173,67	694,68	4		4	694,68	0	694,68	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES 200W	U	13	205,74	2,674.62	13		13	2,674.62	0	2,674.62	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR CONCENTRICO # 3X12 AWG	M	257,14	9,2	2,365.69	257,14		257,14	2,365.69	0	2,365.69	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE PUNTOS DE ILUMINACION	U	17	8,64	146,88	17		17	146,88	0	146,88	100.00%
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA											
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA CON DOS VARILLAS	U	1	161,43	161,43	0	1	1	0	161,43	161,43	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA CON UNA VARILLA	U	1	65,52	65,52	0	1	1	0	65,52	65,52	100.00%



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO**

Lumbaquí – Sucumbíos - Ecuador

COMISION DE GESTION INTERINSTITUCIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL



COMUNIDAD LINDA

Foto No. 7 El contrapiso no está construido



Foto No. 7 Sistema eléctrico no esta instalado





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO

Lumbaquí – Sucumbíos - Ecuador

COMISION DE GESTION INTERINSTITUCIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL

4. COMUNIDAD LINDA											
CANCHA											
CONTRAPISO DE H.S F'C=210 KG/CM2 E=10CM, ALISADO	M2	600	21,04	12,624.00	600	0	600	12,624.00	0	12,624.00	100.00%
MALLA ELECTROSOLDADA R-196	M2	600	5,03	3,018.00	600	0	600	3,018.00	0	3,018.00	100.00%
JUNTA DE DILATACION	M	160	3,9	624	160	0	160	624	0	624	100.00%
SEÑALIZACION DE CANCHA	U	1	559,76	559,76	0	1	1	0	559,76	559,76	100.00%
PINTURA ACRILICA PARA CANCHA(DOS MANOS)	M2	600	4,62	2,772.00	0	600	600	0	2,772.00	2,772.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCOS METALICOS	U	2	612,42	1224,84	0	2	2	0	1224,84	1224,84	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE AROS DE BALONCESTO EN VIDRIO TEMP L	U	2	1,453.35	2,906.70	0	2	2	0	2,906.70	2,906.70	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION MALLA DE VOLEY, INCLUYE SOPORTE	U	1	169,59	169,59	0	1	1	0	169,59	169,59	100.00%
SISTEMA ELECTRICO											
RED MEDIO VOLTAGE											
APROBACION Y RECEPCION DEL PROYECTO ELÉCTRICO	U	1	719,78	719,78	0	1	1	0	719,78	719,78	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO AUTOT	U	1	3,135.84	3,135.84	0	1	1	0	3,135.84	3,135.84	100.00%
RED BAJO VOLTAGE											
BAJANTE Y ACOMETIDA DESDE TRANSFORMADOR AL MEDIDOR											
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE CON TUBERIA EMT DE 3"	U	1	406,95	406,95	1	0	1	406,95	0	406,95	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO DE REVISION TIPO A 60x60x60 CM + TAPA DE POZO	U	2	107,35	214,7	2	0	2	214,7	0	214,7	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE TTU # 2 AWG CO0-0P 2x2+2	M	15,71	33,6	527,86	15,71	0	15,71	527,86	0	527,86	100.00%
TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL					0						
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT PARA ENTRADA Y SALIDA	U	1	71,75	71,75	1	0	1	71,75	0	71,75	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE TTU # 6 AWG CO0-0P 2x6+6	M	14,28	8,55	122,09	14,28	0	14,28	122,09	0	122,09	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DEL GABINETE HERMETICO DE 30 X 50 PARA 8 PUNTOS (INCLUYE ACCESORIOS)	U	1	738,72	738,72	1	0	1	738,72	0	738,72	100.00%
SISTEMA DE ILUMINACION											
SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES 150W	U	4	173,67	694,68	4	0	4	694,68	0	694,68	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES 200W	U	13	205,74	2,674.62	13	0	13	2,674.62	0	2,674.62	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR CONCENTRICO # 3X12 AWG	M	257,14	9,2	2,365.69	257,14	0	257,14	2,365.69	0	2,365.69	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE PUNTOS DE ILUMINACION	U	17	8,64	146,88	17	0	17	146,88	0	146,88	100.00%
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA											
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA CON DOS VARILLA	U	1	161,43	161,43	0	1	1	0	161,43	161,43	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA CON UNA VARILLA	U	1	65,52	65,52	0	1	1	0	65,52	65,52	100.00%

Fuente: Quipux GADMC-Gonzalo Pizarro, periodo de planilla 01-sep hasta 30 septiembre 2024



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO**

Lumbaquí – Sucumbíos - Ecuador

COMISION DE GESTION INTERINSTITUCIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL




SECTOR UNION INDEPENDIENTE

Foto No. 8 El contrapiso no está construido



Foto No. 9 El sistema de iluminación está instalado

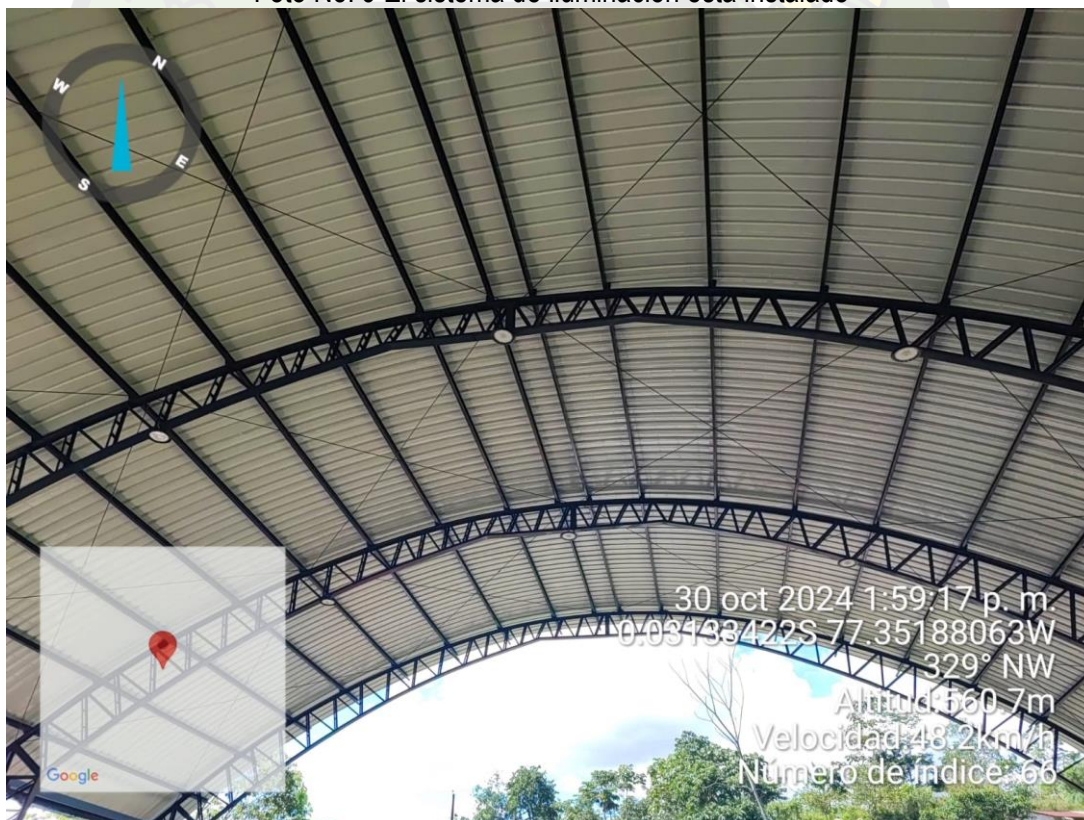



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO**

Lumbagüí – Sucumbíos - Ecuador

COMISION DE GESTION INTERINSTITUCIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL

5. RECINTO UNION INDEPENDIENTE											
CANCHA											
CONTRAPISO DE H.S F'C=210 KG/CM2 E=10CM, ALISADO	M2	600	21,04	12,624.00	600	0	600	12,624.00	0	12,624.00	100.00%
JUNTA DE DILATACION	M	160	3,9	624	160	0	160	624	0	624	100.00%
SEÑALIZACION DE CANCHA	U	1	559,76	559,76	0	1	1	0	559,76	559,76	100.00%
PINTURA ACRILICA PARA CANCHA(DOS MANOS)	M2	600	4,62	2,772.00	0	600	600	0	2,772.00	2,772.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCOS METALICOS	U	2	612,42	1,224.84	0	2	2	0	1,224.84	1,224.84	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE AROS DE BALONCESTO EN VIDRIO TEMPL	U	2	1,453.35	2,906.70	0	2	2	0	2,906.70	2,906.70	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION MALLA DE VOLEY, INCLUYE SOPORTE	U	1	169,59	169,59	0	1	1	0	169,59	169,59	100.00%
DRENAJE AA.LL. CUBIERTA											
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS											
SUMINISTRO E INST.DE CANAL RECOLECTOR DE AA LL EN ACERO INOXIDA	M	64	15,03	961,92	64	0	64	961,92	0	961,92	100.00%
SUMINISTRO E INST. BAJANTES DE AA LL P VC =110MM	M	36	12,91	464,76	36	0	36	464,76	0	464,76	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA P VC Ø =110 MM DESAGÜE	M	10	10,14	101,4	10	0	10	101,4	0	101,4	100.00%

Fuente: Quipux GADMC-Gonzalo Pizarro, periodo de planilla 01-sep hasta 30 septiembre 2024



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO**

Lumbaquí – Sucumbíos - Ecuador

COMISION DE GESTION INTERINSTITUCIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL



COMUNIDAD SAN PABLO

Foto No. 10 Tres personas se encuentran realizando el relleno compactado

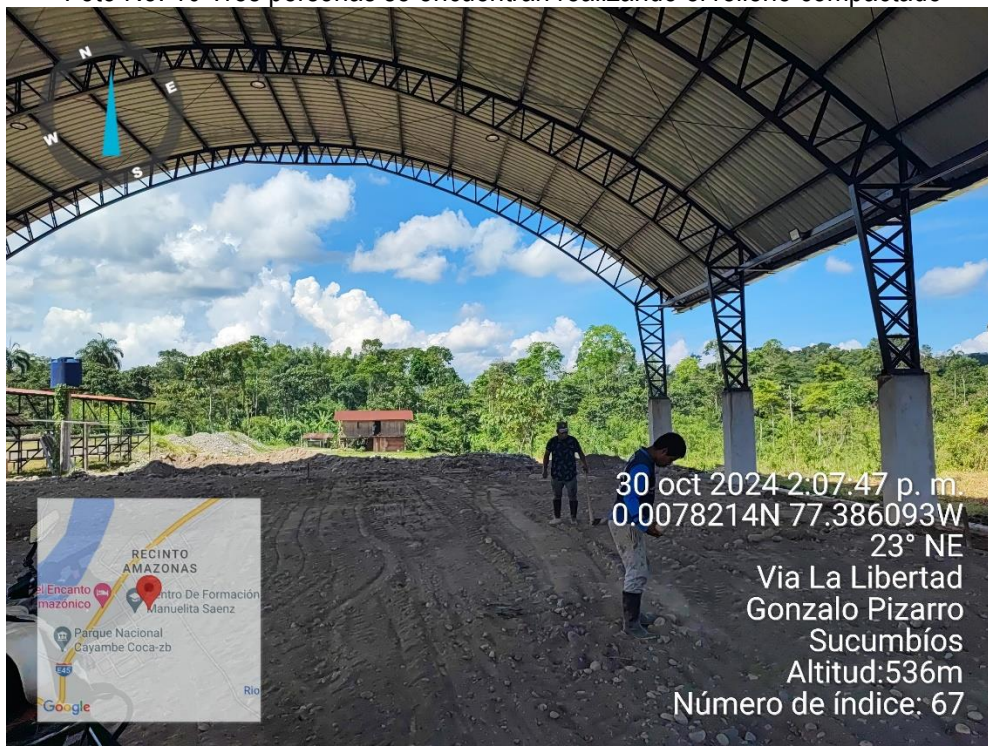


Foto No. 11 Instalado el sistema eléctrico



Se encuentran 3 trabajadores realizando Relleno compactado, sin residente de obra tampoco fiscalizador.



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO**

Lumbaquí – Sucumbíos - Ecuador

COMISION DE GESTION INTERINSTITUCIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL

6. COMUNIDAD SAN PABLO											
CANCHA											
BORDILLO DE H.S.(F'C=210 KG/CM2 - 0,15X0,40)	M	100	17,83	1783.00	100	0	100	1783.00	0	1783.00	100.00%
CONTRAPISO DE H.S F'C=210 KG/CM2 E=10CM, ALISADO	M2	600	21,04	12,624.00	600	0	600	12,624.00	0	12,624.00	100.00%
MALLA ELECTROSOLDADA R-196	M2	600	5,03	3,018.00	600	0	600	3,018.00	0	3,018.00	100.00%
JUNTA DE DILATAION	M	160	3,9	624	160	0	160	624	0	624	100.00%
SEÑALIZACION DE CANCHA	U	1	559,76	559,76	0	1	1	0	559,76	559,76	100.00%
PINTURA ACRILICA PARA CANCHA(DOS MANOS)	M2	600	4,62	2,772.00	0	600	600	0	2,772.00	2,772.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCOS METALICOS	U	2	612,42	1,224.84	0	2	2	0	1,224.84	1,224.84	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE AROS DE BALONCESTO EN VIDRIO TEMPL	U	2	1453.35	2,906.70	0	2	2	0	2,906.70	2,906.70	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION MALLA DE VOLEY, INCLUYE SOPORTE	U	1	169,59	169,59	0	1	1	0	169,59	169,59	100.00%

Fuente: Quipux GADMC-Gonzalo Pizarro, periodo de planilla 01-sep hasta 30 septiembre 2024



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO**

Lumbaquí – Sucumbíos - Ecuador

COMISION DE GESTION INTERINSTITUCIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL




SECTOR KASHA YACU

Foto No. 12 Cancha sin contrapiso (fecha de inspección 30 octubre 2024)



Obra sin trabajadores, contrapiso sin construir.





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO
Lumbaquí – Sucumbíos - Ecuador

COMISION DE GESTION INTERINSTITUCIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL

3. COMUNIDAD KASHA YAKU											
CANCHA											
CONTRAPISO DE H.S F'C=210 KG/CM2 E=10CM, ALISADO	M2	600	2,104	12,624.00	600	0	600	12,624.00	0	12,624.00	100.00%
MALLA ELECTROSOLDADA R-196	M2	600	5,03	3,018.00	600	0	600	3,018.00	0	3,018.00	100.00%
JUNTA DE DILATACION	M	160	3,9	624	160	0	160	624	0	624	100.00%
SEÑALIZACION DE CANCHA	U	1	559,76	559,76	0	1	1	0	559,76	559,76	100.00%
PINTURA ACRILICA PARA CANCHA(DOS MANOS)	M2	600	4,62	2,772.00	0	600	600	0	2,772.00	2,772.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCOS METÁLICOS	U	2	612,42	1,224.84	0	2	2	0	1,224.84	1,224.84	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE AROS DE BALONCESTO EN VIDRIO TEMP L	U	2	1,453.35	2,906.70	0	2	2	0	2,906.70	2,906.70	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION MALLA DE VOLEY, INCLUYE SOPORTE	U	1	169,59	169,59	0	1	1	0	169,59	169,59	100.00%
DRENAJE AA.LL. CUBIERTA											
SUMINISTRO E INST.BAJANTES DE AA LL PVC =110MM	M	36	12,91	464,76	36	0	36	464,76	0	464,76	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC Ø =110 MM DESAGÜE	M	10	10,14	101,4	10	0	10	101,4	0	101,4	100.00%
SISTEMA ELECTRICO											
RED MEDIO VOLTAJE											
APROBACION Y RECEPCION DEL PROYECTO ELÉCTRICO	U	1	719,78	719,78	0	0	0	0	0	0	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO AUTOT	U	1	3,135.84	3,135.84	0	0	0	0	0	0	0.00%
RED BAJO VOLTAJE											
BAJANTE Y ACOMETIDA DESDE TRANSFORMADOR AL MEDIDOR											
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE CON TUBERIA EMT DE 3"	U	1	406,95	406,95	1	0	1	406,95	0	406,95	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO DE REVISION TIPO A 60x60x60 CM +TAPA DE POZO	U	2	107,35	214,7	2	0	2	214,7	0	214,7	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE TTU # 2 AWG CO0-0P 2x2+2	M	15,71	33,6	527,86	15,71	0	15,71	527,86	0	527,86	100.00%
TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL											
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT PARA ENTRADA Y SALIDA	U	1	71,75	71,75	1	0	1	71,75	0	71,75	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE TTU # 6 AWG CO0-0P 2x6+6	M	14,28	8,55	122,09	14,28	0	14,28	122,09	0	122,09	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DEL GABINETE HERMETICO DE 30 X 50 PARA 8 PUNTOS (INCLUYE ACCISORIOS)	U	1	738,72	738,72	1	0	1	738,72	0	738,72	100.00%
SISTEMA DE ILUMINACION											
SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES 150W	U	4	173,67	694,68	4	0	4	694,68	0	694,68	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES 200W	U	13	205,74	2,674.62	13	0	13	2,674.62	0	2,674.62	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR CONCENTRICO # 3X12 AWG	M	257,14	9,2	2,365.69	257,14	0	257,14	2,365.69	0	2,365.69	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE PUNTOS DE ILUMINAC	U	17	8,64	146,88	17	0	17	146,88	0	146,88	100.00%
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA											
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA CON DOS VARILLA	U	1	161,43	161,43	0	1	1	0	161,43	161,43	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA CON UNA VARILLA	U	1	65,52	65,52	0	1	1	0	65,52	65,52	100.00%

Fuente: Quipux GADMC-Gonzalo Pizarro, periodo de planilla 01-sep hasta 30 septiembre 2024



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO**

Lumbaquí – Sucumbíos - Ecuador

COMISION DE GESTION INTERINSTITUCIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL



RESUMEN DE COMPONENTES Y RUBROS NO CONSTRUIDOS DE MAYOR VALOR

No.	NOMBRE DEL SECTOR	RESUMEN COMPONENTE NO CONSTRUIDOS (mas relevantes)
1	Cubierta Recinto La Amarilla	Entechado Galvalumen prepintado
		Cancha: Contrapiso no construido y demás rubros que derivan
		Sistema de Eléctrico
		Instalaciones drenaje Pluvial-redes externas
		Instalaciones drenaje aguas lluvias-cubierta
2	Comunidad Waira Urco	Entechado Galvalumen, sin culminar 50%
		Cancha
		Sistema de Eléctrico
3	Comunidad Linda	Cancha: Contrapiso no construido y demás rubros que derivan
		Sistema de Eléctrico
4	Corporación Playas del Tigre	Cancha: Contrapiso no construido y demás rubros que derivan
		Sistema de Eléctrico
5	Recinto Unión Independiente	Cancha: Contrapiso no construido
6	Comunidad San Pablo	Cancha: Contrapiso no construido
7	Comunidad Kasha Yacu	Cancha: Contrapiso no construido y demás rubros que derivan
		Sistema de Eléctrico

Este resumen está relacionado con la planilla No 5 de avance de obra donde están detallados componentes y rubros.

3.- CONCLUSIONES

- Para la inspección se tiene como referencia la planilla No. 5 del periodo desde 01 septiembre 2024 hasta 30 septiembre 2024, que se encuentra en el Quipux de la Institución del GADMC Gonzalo Pizarro, quien suscribe es el fiscalizador Ing. Edi Xavier Recuenco Pardo Firma electrónica de fecha 2024-10-22T16:51:12.106075-05:00; residente obra Ing. Dario Javier Moposina Centeno, Consorcio Galume Contratista Hermin Eduardo Lara Poveda. (Adjunto Planilla No 5 de avance de obra).
- El residente de obra y fiscalizador de la obra no estuvieron presentes al momento de la inspección en ninguna de las 7 canchas, fecha 30-10-2024.
- **NORMAS DE CONTROL DEL SECTOR PUBLICO Y JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO no cumplen con el Art. 408-20 Documentos que deben permanecer en obra, 408-21 Libro de obra**
- **In situ (fotos) se constata el estado de la obra y la mayoría de los componentes y rubros no coinciden con los rubros planillados y descritos 100% de cumplimiento correspondiente a la Planilla No 5 de avance de obra; componentes y rubros que no se encuentran contruidos hasta la fecha 30 octubre 2024.**
- Se constata in situ y con registro fotográfico que se incumplió con **NORMAS DE CONTROL DEL SECTOR PUBLICO Y JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO Art 408-26 Medición de la obra ejecutada, debido a que Componentes y rubros no se encuentran ejecutados.**



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO**

Lumbaquí – Sucumbíos - Ecuador

COMISION DE GESTION INTERINSTITUCIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL



4.- RECOMENDACIONES

- Al administrador del contrato velar por el fiel cumplimiento según las Normas del control interno, 408-16 Administración del contrato y administración de la obra, 408-17 Administrador del contrato, Art. 303. Atribuciones del administrador del contrato.-
- Al fiscalizador, NORMAS DE CONTROL DEL SECTOR PUBLICO Y JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO, 408-19 Fiscalizadores Cumplir con las funciones del fiscalizador, b) Evaluar mensualmente el grado de cumplimiento del programa de trabajo en el área bajo su cargo y en caso de constatar desviaciones identificar las causas y proponer soluciones para corregir la situación. 408-22 Control del avance físico, 408-23 Control de calidad, 408-24 Control financiero de la obra. 408-26 Medición de la obra ejecutada.
- **Realizar el trámite respectivo para determinar responsabilidades por inconsistencias en los componentes y rubros no ejecutados, y que reflejan como cumplidos al 100% en la Planilla No. 5 de avance de obra, del contrato CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS CUBIERTAS DE USO MÚLTIPLE PARA VARIOS SECTORES DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS.** (Adjunto planilla No. 5 del periodo desde 01 septiembre 2024 hasta 30 septiembre 2024). Incumplimiento de NORMAS DE CONTROL DEL SECTOR PUBLICO Y JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO, 408-22 Control del avance físico, 408-24 Control financiero de la obra. 408-26 Medición de la obra ejecutada.
- Continuar con el debido proceso.

Atentamente,

Dr. Jorge Tipanluiza
CONCEJAL URBANO

Sr. Arturo Narváez
CONCEJAL RURAL
